COMITE PERMANENT SUR LE DEMINAGE, L'EDUCATION AU RISQUE ET LA TECHNOLOGIE

Genève, 27 au 31 mai 2013

DEMINAGE

ENQUETES NON TECHNIQUES

- Localités visitées depuis déc.2012: **27**
- Zones dangereuses confirmées : **19**
- Nombre total de localités renfermant des ZDC: **46**
- Localités déclassées depuis déc. 2012: **66**

LOCALITES RESTANT À ENQUÊTER

- Département de Bignona: **280**
- Département de Ziguinchor: **12** abandonnées
- Département d'Oussouye: **04** abandonnées

Total: **296**

SUPERFICIES À DÉPOLLUER

Superficie accessible estimée: **333.415** m².

- Ziguinchor : 53 478 m²
- Oussouye : 112 000 m²
- Bignona : 18 400 m²
- Goudomp : 149 537 m²

ZONES D'INTERVENTION OPERATEURS

- **MECHEM**: département de Ziguinchor;
- **NPA**: département d'Oussouye;
- **Handicap International:** département de Kolda;
- **MECHEM , HI et NPA**: département de Goudomp;

SITUATION DEMINAGE

- Superficie dépolluée entre déc. 2012 et le 30 avril 2013: **167.782 m²**

(Amélioration des rendements par la combinaison du déminage mécanique à des moyens cynophiles et manuels.)

- Nombre de mines et REG découverts dans la période: **136**
- Surface totale nettoyée: **658.115,66 m²**
- Nombre total de mines et REG découverts: **400**

ÉVOLUTION DES SUPERFICIES DÉMINÉES

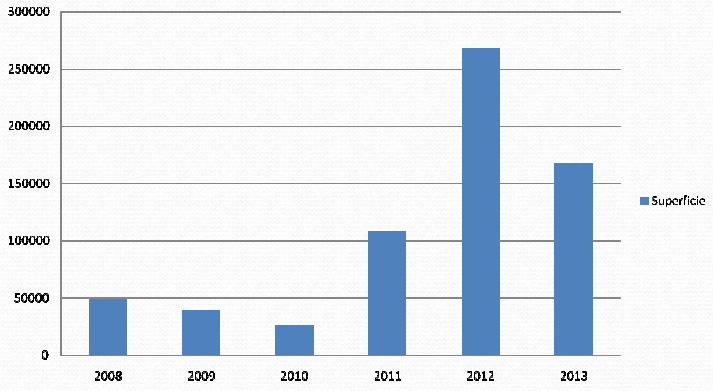

RESTITUTION

- Nombre de localités restituées : **45**
  - après déminage : **01**
  - après enquêtes non techniques: **44**

- Nombre total de localités restituées : **66**
  (**14** par déminage et **52** par enquêtes non techniques)

RESPECT DES OBLIGATIONS

- Avec un rendement prévisionnel de **500.000** m² par an rapporté au nombre d'opérateurs et à la superficie restante connue et accessible, le Sénégal pourra remplir ses obligations, si le processus de paix évolue favorablement.

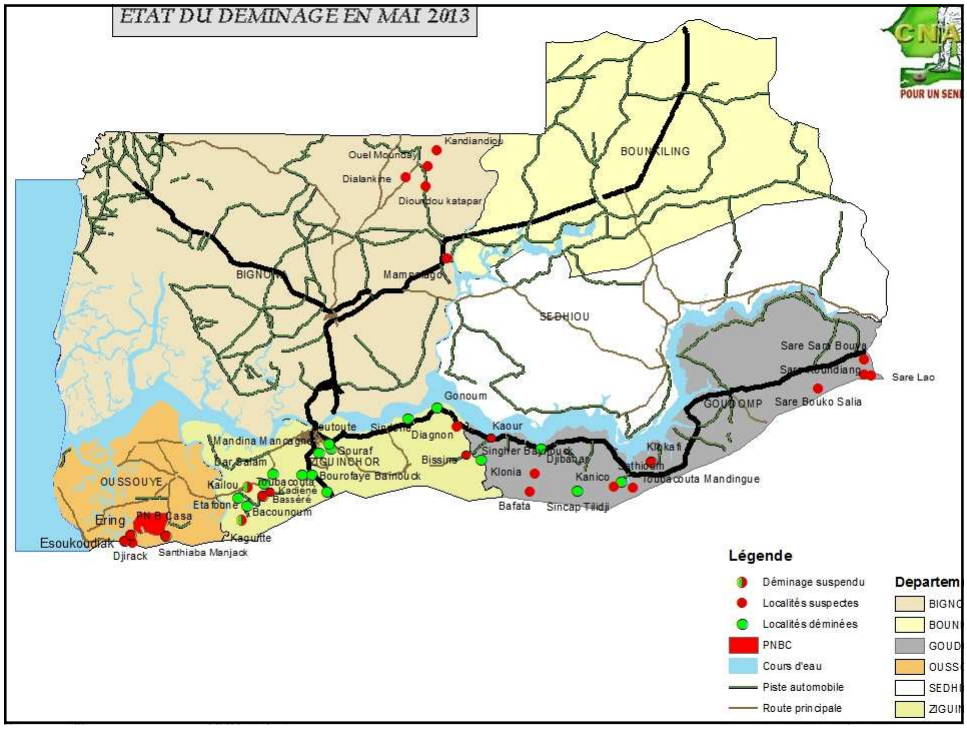

CONTRAINTES

- Enlèvement de démineurs
- Existence de zones d'insécurité
- Ralentissement des opérations en hivernage.

EDUCATION AU RISQUE

- Mise en place du Réseau des journalistes spécialisés dans l'action antimines au Sénégal (REJAMS)

- Formation de **90** journalistes

- Formation au LST de 130 acteurs au développement:

PERSPECTIVES

- Validation des normes révisées
- Table ronde des bailleurs
- Poursuite des opérations de déminage;
- Poursuite des enquêtes non techniques.
- Déploiement d'équipes de chiens détecteurs d'explosifs de mines par NPA et HI.
- Poursuite des activités d'ERM

EDUCATION AU RISQUE

- Formation des membres des bureaux des ODCAV de Bignona, Oussouye et Ziguinchor
- Financements de projets d'ERM
- Formation des **180** acteurs suivants:
  - **40** membres du CRC de Ziguinchor
  - **40** membres de l'ORCAV de Ziguinchor
  - **25** membres des GPF de Dioulacolon
  - **50** membres des GPF de Sédhiou
  - **10** membres de l'association COPI de Bignona
  - **15** agents d'agriculture de Bignona

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION
