



**VII REUNION DE ESTADOS PARTES
18 - 22 DE SEPTIEMBRE 2006
GINEBRA**

REPORTE SOBRE REMOCION DE MINAS EN NICARAGUA

EN NICARAGUA, COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO BÉLICO DESARROLLADO EN LOS AÑOS OCHENTA Y SEGÚN REGISTROS DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA AL AÑO 1989, SE INSTALARON 135,643 MINAS, EN 991 OBJETIVOS; SIN EMBARGO ESTUDIOS REALIZADOS EN 1991 CON LA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA (JID) DIO COMO RESULTADO LA PROBABILIDAD DE LA EXISTENCIA DE MÁS DE 150 MIL MINAS, YA QUE EL EJÉRCITO CONTABA A ESA FECHA CON EL 80% DE LOS REGISTROS. ESOS OBJETIVOS O SITIOS MINADOS, SE LOCALIZARON EN LA PRINCIPAL RED VIAL DEL PAÍS (PUENTES), RED DE DISTRIBUCIÓN ENERGÉTICA (TORRES DE ALTA TENSIÓN), SUB. - ESTACIONES ELÉCTRICAS, HIDROELÉCTRICAS, ESTACIONES REPETIDORAS, PISTAS AERÉAS, ALMACENES, SECTORES FRONTERIZOS, POBLADOS Y COOPERATIVAS *GRÍCOLAS.


HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2006, SE HAN BENEFICIADO MAS DE 2 MILLONES DE PERSONAS EN 65 MUNICIPIOS QUE SE ENCONTRABAN MINADOS, MEDIANTE LA DESTRUCCIÓN DE 574,000 ARTEFACTOS EXPLOSIVOS NO EXPLOSIONADOS (UXO'S) Y LA DESTRUCCIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE LA NO EXISTENCIA Y DESTRUIDAS POR OTRAS CAUSAS DE 140,910 MINAS DE UN UNIVERSO DE MINAS DE MÁS DE 160 MIL MINAS INSTALADAS REGISTRADAS Y/O DENUNCIADAS POR LA POBLACIÓN CIVIL, POR ANTIGUOS ZAPADORES QUE VIVEN CERCA DE LAS ZONAS AFECTADAS CON MINAS Y POR LOS RESULTADOS DE ESTUDIOS DEL NIVEL I (INVESTIGACIÓN DE CAMPO).

ELLO SIGNIFICA QUE A ESTA FECHA, CON EL TOTAL DE MINAS DESTRUIDAS (140,910) SE HA SUPERADO EN 3.88% LAS ESTIMACIONES INICIALES SEGÚN LOS REGISTROS DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA, Y LA EXISTENCIA AÚN DE 19,659 MINAS INSTALADAS, PREVISTAS A DESTRUIR (APROXIMADAMENTE 6,393 MINAS EN LO QUE FALTA DEL AÑO 2006 Y 13,266 MINAS EN TODO EL AÑO 2007).

LA META ANTES EXPUESTA SERÁ POSIBLE, SI LOS PAÍSES Y ORGANIZACIONES DONANTES Y COOPERANTES MANTIENEN EL FINANCIAMIENTO ACTUAL, DURANTE TODO EL AÑO 2007, Y ASÍ PODER DECLARAR AL FINAL DE ESE AÑO A NICARAGUA TERRITORIO LIBRE DE MINAS.


ANEXO, MAPA DE AVANCE, RELACIÓN DE MINAS INSTALADAS DESTRUIDAS, PROYECCIÓN Y REQUERIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL AÑO 2007.

ANEXOS

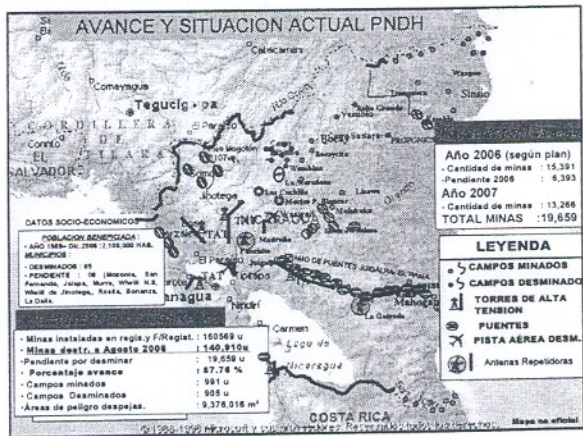

TIPO DE OBJETIVOS MINADOS	CM EN REGIS. TRG.	CM FUERA DE REGIS. TRG.	MINAS				MINAS PENDIENTE POR DESTRUIR AÑO 2006	PROYEC. OIGM 2007 EN REGISTRO Y F.R SIN FORMULA MIO.	TOTAL
			EXISTENCI A CON FORMU LARIO.	DESTRUI DAS FUERA DE REGISTRO	DESTRUI DAS CON FORMULA MIO.	TOTAL DESTRUI DAS.			
T.A.T.	323	4	14,919	226	14,919	15,145	-	-	15,145
SUB-ESTAC.ELECT.	3	-	6,298	-	6,298	6,298	-	-	6,298
ANTENAS REPETIDORAS	2	-	2,493	-	2,493	2,493	-	-	2,493
ALMACENES	8	1	11,444	4,951	9,346	14,295	-	-	14,295
PUNTEROS	39	-	2,738	-	2,738	2,738	-	-	2,738
ARENT. Y COOPERATIVAS	27	14	28,577	4,873	28,497	31,170	2,300	-	33,470
PISTAS AEREAS	2	1	3,701	585	3,701	4,286	-	-	4,286
FRONTERA NORTE	425	25	55,953	2,929	51,474	54,403	**4,093	13,266	71,762
FRONTERA SUR	159	6	4,457	582	4,457	5,019	-	-	5,019
PLANTA HIDRO-ELECTRICA	3	-	5,963	-	5,963	5,963	-	-	5,963
TOTAL	994	51	139,643	13,098	126,964	140,910	6,393	13,266	160,906

** 500 MINAS PROYECTADAS AL DS EN EL 2006 QUE ESTAN FUERA DE REGISTRO
CM: CAMPO MINADO, F.R: FUERA DE REGISTRO

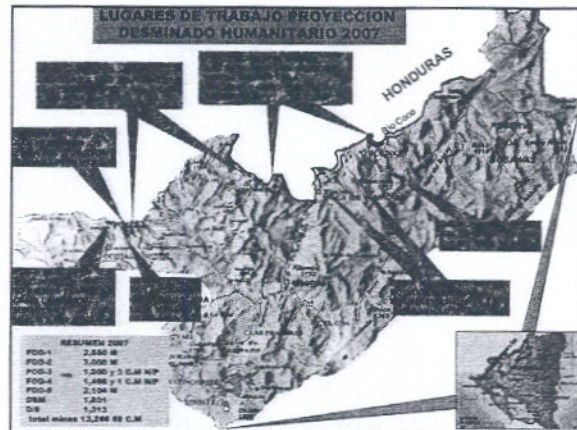

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE DESMINADO-2007																				
NO	UNIDAD	OBJETIVOS	COORD.	CANT. MINAS	CAN. OBJ.	PLANIFICACION 2007														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
1	FOD-1	Sancuero	3365	1,380	1															
		Las Nubes	2195	1,190	1															
		SUB-TOTAL		2,558	2															
2	FOD-2 ***** *****	Manzanal - Sancuero	3227	1,250	5															
		Las Pintas	4436	500	5															
		Cuacari - Barrakey	4542	1,150	4															
SUB-TOTAL			3668	15																
3	FOD N°3	Raposo y Camaron	3126	N.P	1															
		Guacari	3225	N.P	1															
		La Kibonine	3225	N.P	-															
SUB-TOTAL			6350	9																
4	FOD N°4	Caracina	3916	N.P	3															
		El Limi	2977	258	3															
		La Chamusca	3066	1,240	1															
SUB-TOTAL			1,498	7																
5	FOD-5	Cuartile La Gloria - Projesa	2155	255	4															
		Rio Suesada	2056	60	3															
		El Pinar - Cerro Prietas	2158	434	5															
SUB-TOTAL			2,194	16																

Continuación																				
NO	UNIDAD	OBJETIVOS	COORD.	CANT. MINAS	CAN. OBJ.	PLANIFICACION 2007														
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
6	DSM	La Chamusca	2067	221	1															
		La Chamusca	2068-1	1,329	2															
		La Nubes	2167	281	1															
SUB-TOTAL			1,801	4																
7	DS	Atencion a servico																		
		Barrakey	4448	1,313	5															
SUB-TOTAL			1,313	5																
TOTAL GENERAL				13,266	58															

TOTAL GENERAL : 13,266
PROMEDIO MENSUAL: 1,105

REPUBLICA DE NICARAGUA						
NECESIDADES DE LA COOPERACION INTERNACIONAL AL PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO PARA EL AÑO 2007						
FOD NO.	DONANTES	AÑO 2007				TOTAL 2007
		1ER TRIMESTRE	2DO. TRIMESTRE	3ER. TRIMESTRE	4TO. TRIMESTRE	
FOD # 1	DINAMARCA			150,000	150,000	300,000
FOD # 2	DINAMARCA			150,000	150,000	300,000
FOD # 3	SUECIA	772,534	172,968	140,546	133,988	1,220,016
FOD # 4	NORUEGA					
FOD # 5	E.E.U.U.					
DSM	JAPON					
DS	E.E.U.U.					
TOTALES		772,534	172,968	440,546	433,968	1,820,016

NOTAS:
1. EL PRIMER DESEMBOLO DEL FRENTE DE OPERACIONES NO. 3, ES MAYOR DEBIDO A QUE TENEMOS QUE EQUIPARLO COMPLETAMENTE, YA QUE PAGADORA NOS HA COMUNICADO QUE EL EQUIPAMIENTO ACTUAL LO DISTRIBUIRA EN LOS FOD No. 4 y 5.
2. NECESIDAD DE EXTENSION DEL FINANCIAMIENTO POR PARTE DE SUECIA, DINAMARCA Y LOS ESTADOS UNIDOS, AL PROGRAMA NACIONAL DE DESMINADO PARA EL AÑO 2007.
3. LOS FRENTE DE OPERACIONES No. 4, 5 Y DESTACAMENTO BARRERMINAS MECANIZADO, ESTA ASEGURADO SU FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2007.
